



Lampiran 1. Gambar Kerja



Gambar Tampak Depan Gedung Serba Guna



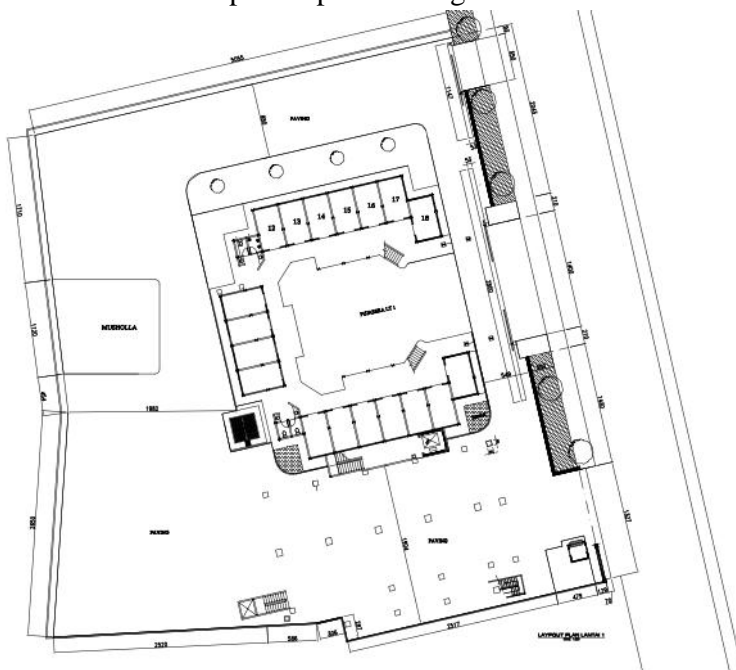

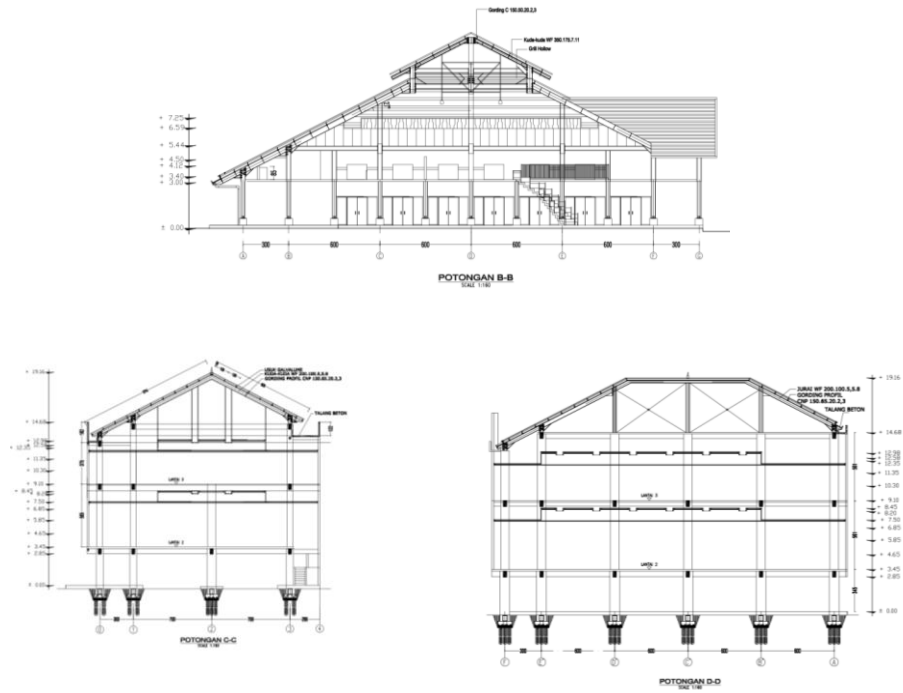

Gambar Potongan Gedung Serba Guna

## Lampiran 2. RAB

Tabel Pekerjaan Finishing Pembangunan Gedung Serba Guna Kabupaten Gresik

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga	Bobot
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>		
1	Pekerjaan Persiapan	65.223.175,27	2,53
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN GEDUNG</b>		
2	Pekerjaan Showroom Pujasera LT.1	356.267.268,46	13,84
3	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela Aluminium Pintu P, Pujasera LT.1	224.310.361,00	8,71
4	Pekerjaan Finishing Pujasera LT.1	2.086.560,00	0,08
5	Pekerjaan Tanah dan Taman	462.542.686,22	17,96
6	Pekerjaan Elektrikal Pujasera LT.1	106.035.991,00	4,12
7	Pekerjaan Tanah dan Pondasi Pos Jaga	3.015.708,00	0,12
8	Pekerjaan Pasangan Pos Jaga	29.464.604,60	1,14
9	Pekerjaan Kusen dan Aksesoris Pos Jaga	11.312.946,88	0,44
10	Pekerjaan Pengecatan Pos Jaga	1.249.880,00	0,05
11	Pekerjaan Railling Tangga Gedung Serbaguna LT.1	39.423.820,26	1,53
12	Pekerjaan Pengecatan Gedung Serbaguna LT 1	953.208,00	0,04
13	Pekerjaan Instalasi Lift Penumpang	377.000.000,00	14,64
14	Pekerjaan Penunjang diruang mesin Elevator / Liift	51.910.920,00	2,02
15	Pekerjaan Pasangan Gedung Serbaguna LT.2	256.814.263,60	9,97
16	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela Aluminium Gedung Serbaguna LT.2	65.617.448,80	2,55
17	Pekerjaan Pengecatan Gedung Serbaguna LT.2	2.408.097,60	0,09
18	Pekerjaan Penghubung Pujasera dan Gedung Serbaguna	160.032.925,01	6,22
19	Pekerjaan Beton Bertulang Gedung Serbaguna LT.3	660.000,00	0,03
20	Pekerjaan Pasangan Gedung Serbaguna LT.3	33.899.060,94	1,32
21	Pekerjaan Sanitair Gedung Serbaguna LT.3	30.717.865,00	1,19
22	Pekerjaan Elektrikal Gedung Serbaguna LT.3	283.941.274,10	11,03
23	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela Aluminium Gedung Serbaguna LT.3	9.920.000,00	0,39
	Jumlah	<b>2.574.808.064,74</b>	100,00

## Lampiran 3. Jadwal Proyek

Tabel 4.2. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Finishing Pembangunan Gedung Serba Guna Kabupaten Gresik

No	Jenis Pekerjaan	Waktu Pelaksanaan																
		September					Oktober				November				Desember			
		02 - 08	09 - 15	16 - 22	23 - 29	30 - 06	07 - 13	13 - 20	21 - 27	28 - 04	05 - 11	12 - 18	19 - 25	26 - 02	03 - 09	10 - 16	17 - 23	24-30
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pekerjaan Persiapan	0,10	0,31	0,29	0,10	0,15	0,00	0,35	0,24	0,00	0,43	0,31	0,00	0,28	0,10			
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN GEDUNG</b>																	
2	Pekerjaan Showroom Pujasera LT.1					0,28		2,84	3,22	0,85	0,33	3,31	0,78	0,43	0,94	0,92	0,55	
3	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela Aluminium Pintu P. Pujasera LT.1										1,82	0,55	2,42	2,04	1,00	0,89		
4	Pekerjaan Finishing Pujasera LT.1									0,04	0,04							
5	Pekerjaan Tanah dan Taman			0,99	0,09	0,09	0,42	1,08		9,48	2,13	3,51	0,16	0,34	0,96	0,24		
6	Pekerjaan Elektrikal Pujasera LT.1												2,02		0,73	0,66	0,26	
7	Pekerjaan Tanah dan Pondasi Pos Jaga					0,13												
8	Pekerjaan Pasangan Pos Jaga					1,03					0,20							
9	Pekerjaan Kusen dan Aksesoris Pos Jaga															0,22	0,22	
10	Pekerjaan Pengecatan Pos Jaga										0,05							
11	Pekerjaan Railling Tangga Gedung Serbaguna LT.1						0,10	0,30		0,10		0,32			0,06		0,20	
12	Pekerjaan Pengecatan Gedung Serbaguna LT.1									0,04					0,00		0,00	
13	Pekerjaan Instalasi Lift Penumpang													5,90	5,10	2,64		
14	Pekerjaan Penunjang diruang mesin Elevator / Liift													0,00	0,44	1,50		
15	Pekerjaan Pasangan Gedung Serbaguna LT.2				2,23							1,64	0,84		1,46	0,19	3,08	
16	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela Aluminium Gedung Serbaguna LT.2									0,16	0,14	0,16			0,76	1,00	0,34	
17	Pekerjaan Pengecatan Gedung Serbaguna LT.2									0,01	0,01				0,00	0,07		
18	Pekerjaan Penghubung Pujasera dan Gedung Serbaguna										0,45	0,72	1,91	2,43	0,19	0,51		
19	Pekerjaan Beton Bertulang Gedung Serbaguna LT.3							0,03										
20	Pekerjaan Pasangan Gedung Serbaguna LT.3						0,37	0,37		0,54	0,12					0,02		
21	Pekerjaan Sanitair Gedung Serbaguna LT.3										1,19							
22	Pekerjaan Elektrikal Gedung Serbaguna LT.3												3,08		3,03	2,98	1,94	
23	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela Aluminium Gedung Serbaguna LT.3											0,16				0,23		
	Bobot Rencana Kemajuan Fisik Mingguan	0,01	1,43	1,81	1,91	2,40	3,56	7,13	8,65	8,27	7,67	7,26	14,57	14,71	13,60	3,57	2,67	0,79
	Bobot Rencana Kumulaif Kemajuan Fisik Mingguan	0,01	1,44	3,25	5,16	7,56	11,12	18,25	26,89	35,16	42,83	50,09	64,66	79,37	92,97	96,54	99,21	100,00
	Bobot Realisasi Kemajuan Fisik Mingguan	0,10	0,31	1,29	2,42	1,69	0,89	4,96	3,46	11,23	6,92	10,66	11,21	5,52	15,14	13,46	10,73	
	Bobot Realisasi Kumulatif Kemajuan Fisik Mingguan	0,10	0,41	1,70	4,12	5,81	6,70	11,66	15,12	26,35	33,27	43,93	55,15	60,67	75,81	89,27	100,00	
	Deviasi	0,10	-1,02	-1,55	-1,04	-1,75	-4,42	-6,59	-11,77	-8,81	-9,56	-6,16	-9,51	-18,70	-17,16	-7,27	0,79	



